


Planning HOV Station Beverwijk

Datum: 24 januari 2024

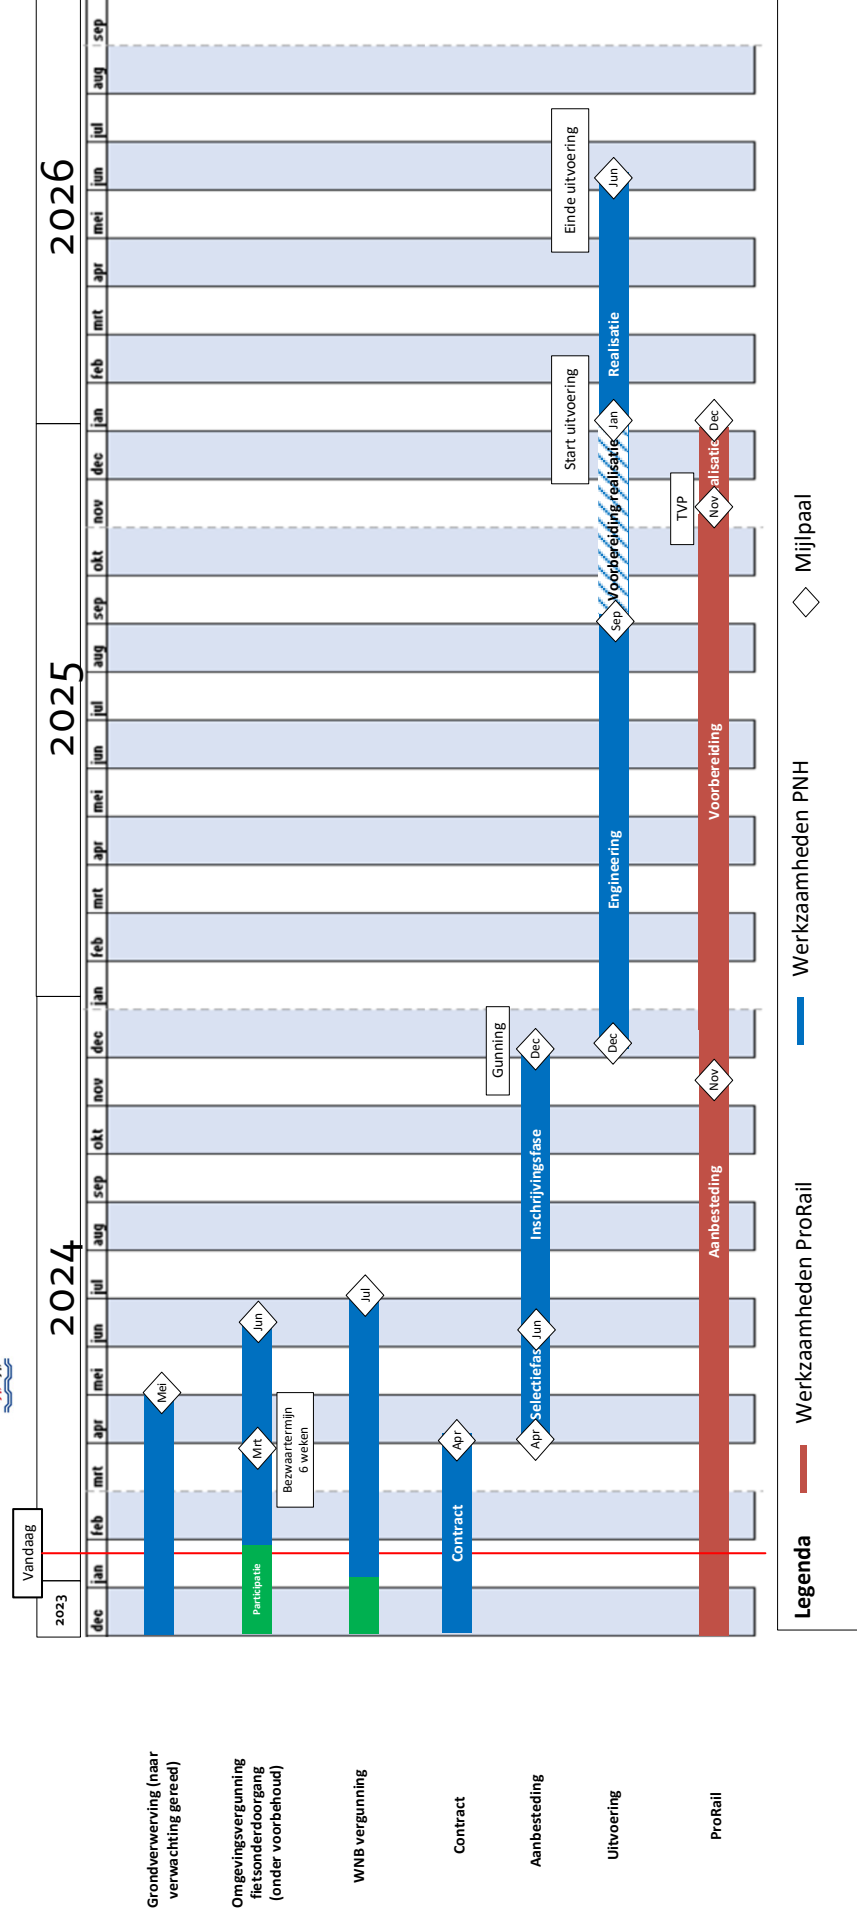

Grondverwerving (naar verwachting gereed)

Omgevingsvergunning fietsonderdoorgang (onder voorbereid)

WNB vergunning

Contract

Aanbesteding

Uitvoering

ProRail

Uitgangspunten Projectplanning PNH

- Werkzaamheden K&L gereed Oktober 2023
- Start aanvraag omgevingsvergunning 29 januari 2024
- Contract 100% maart 2024
- Projectovereenkomst ProRail voor start aanbesteding PNH
- Duur aanbesteding = 8 maanden
- Duur engineering = 9 maanden
- Start uitvoering PNH september 2025 (voor de TVP zal ON al starten met een aantal werkzaamheden)
- TVP (Trein Vrije Periode) is voorlopig vastgesteld van 15 t/m 22 november 2025
- Einde uitvoering juni 2026

Planning is onder voorbereid
