


Keuringsformulier controle vrijboord


Controle vrijboord middels duimstop om gedrag ponton te controleren met berekening

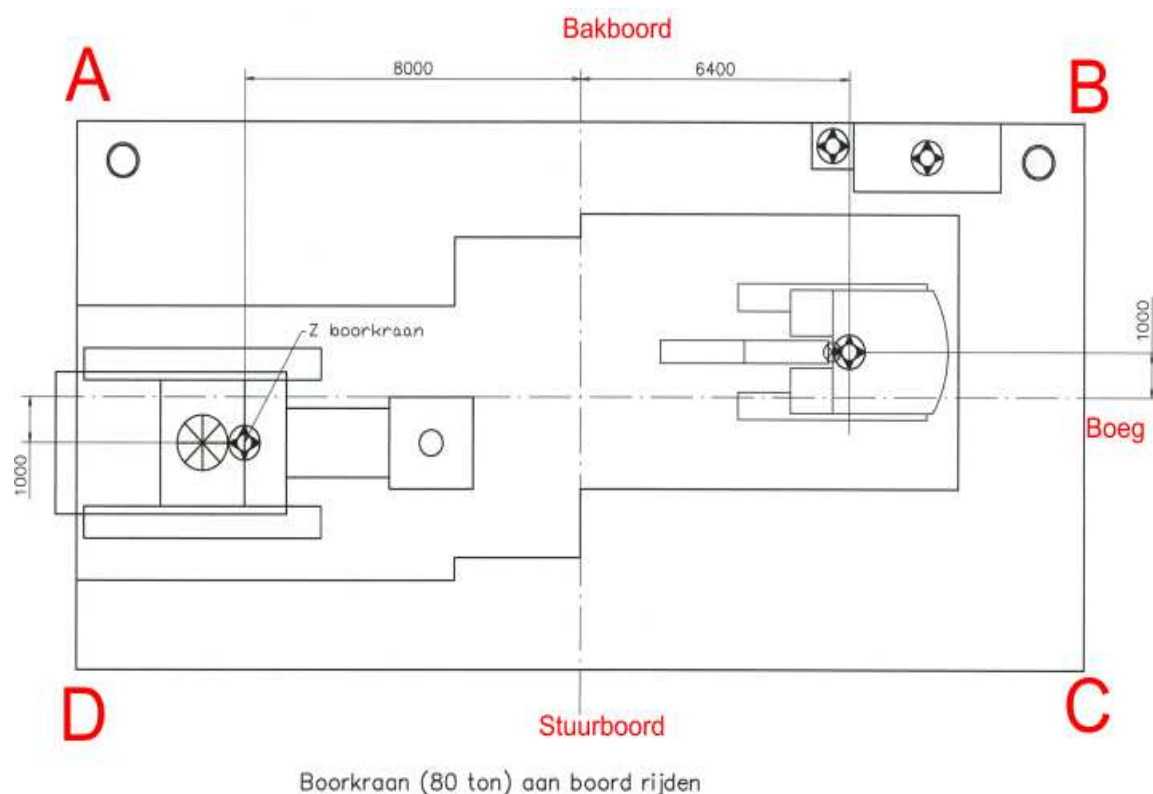


Berekende waardes op basis van ponton 24x12m. Berekening versie v5(Kandt) datum 11-07-2018

	A		B		C		D	
Situatie	berekend	praktijk	berekend	praktijk	berekend	praktijk	berekend	praktijk
Beladen ponton	0,963		0,538		0,944		1,369	
Hulpkraan aan boord	0,789		0,647		0,993		1,315	
Hulpkraan naar voren	0,967		0,338		0,815		1,444	
Boorkraan aan boord	0,263		0,765		0,963		0,461	


Controle uitgevoerd door:	
Datum	
Paraaf	

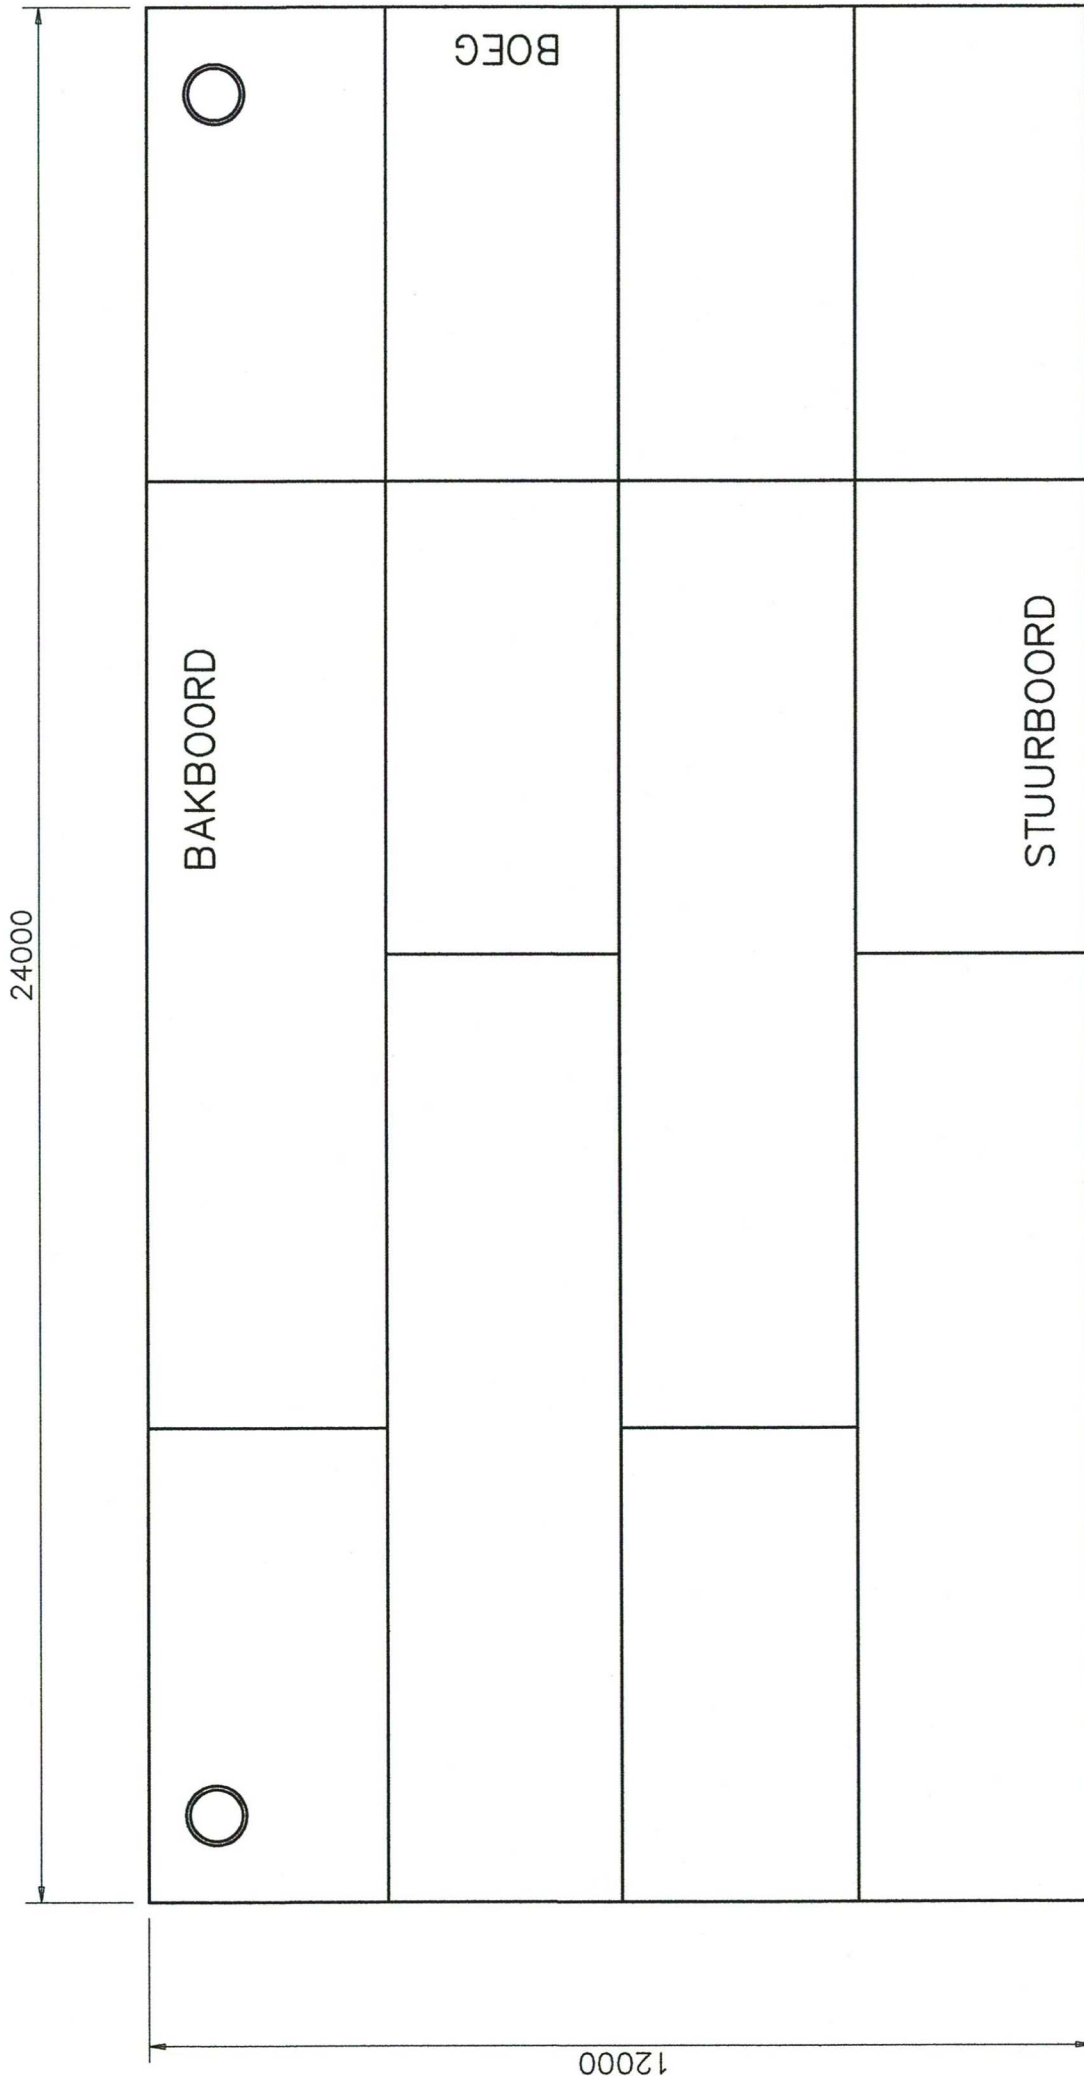


Opbouw ponton:
 8 stuks 6,00x3,00x1,50 m
 4 stuks 12,00x3,00x1,50 m
 totaalgewicht 96 ton

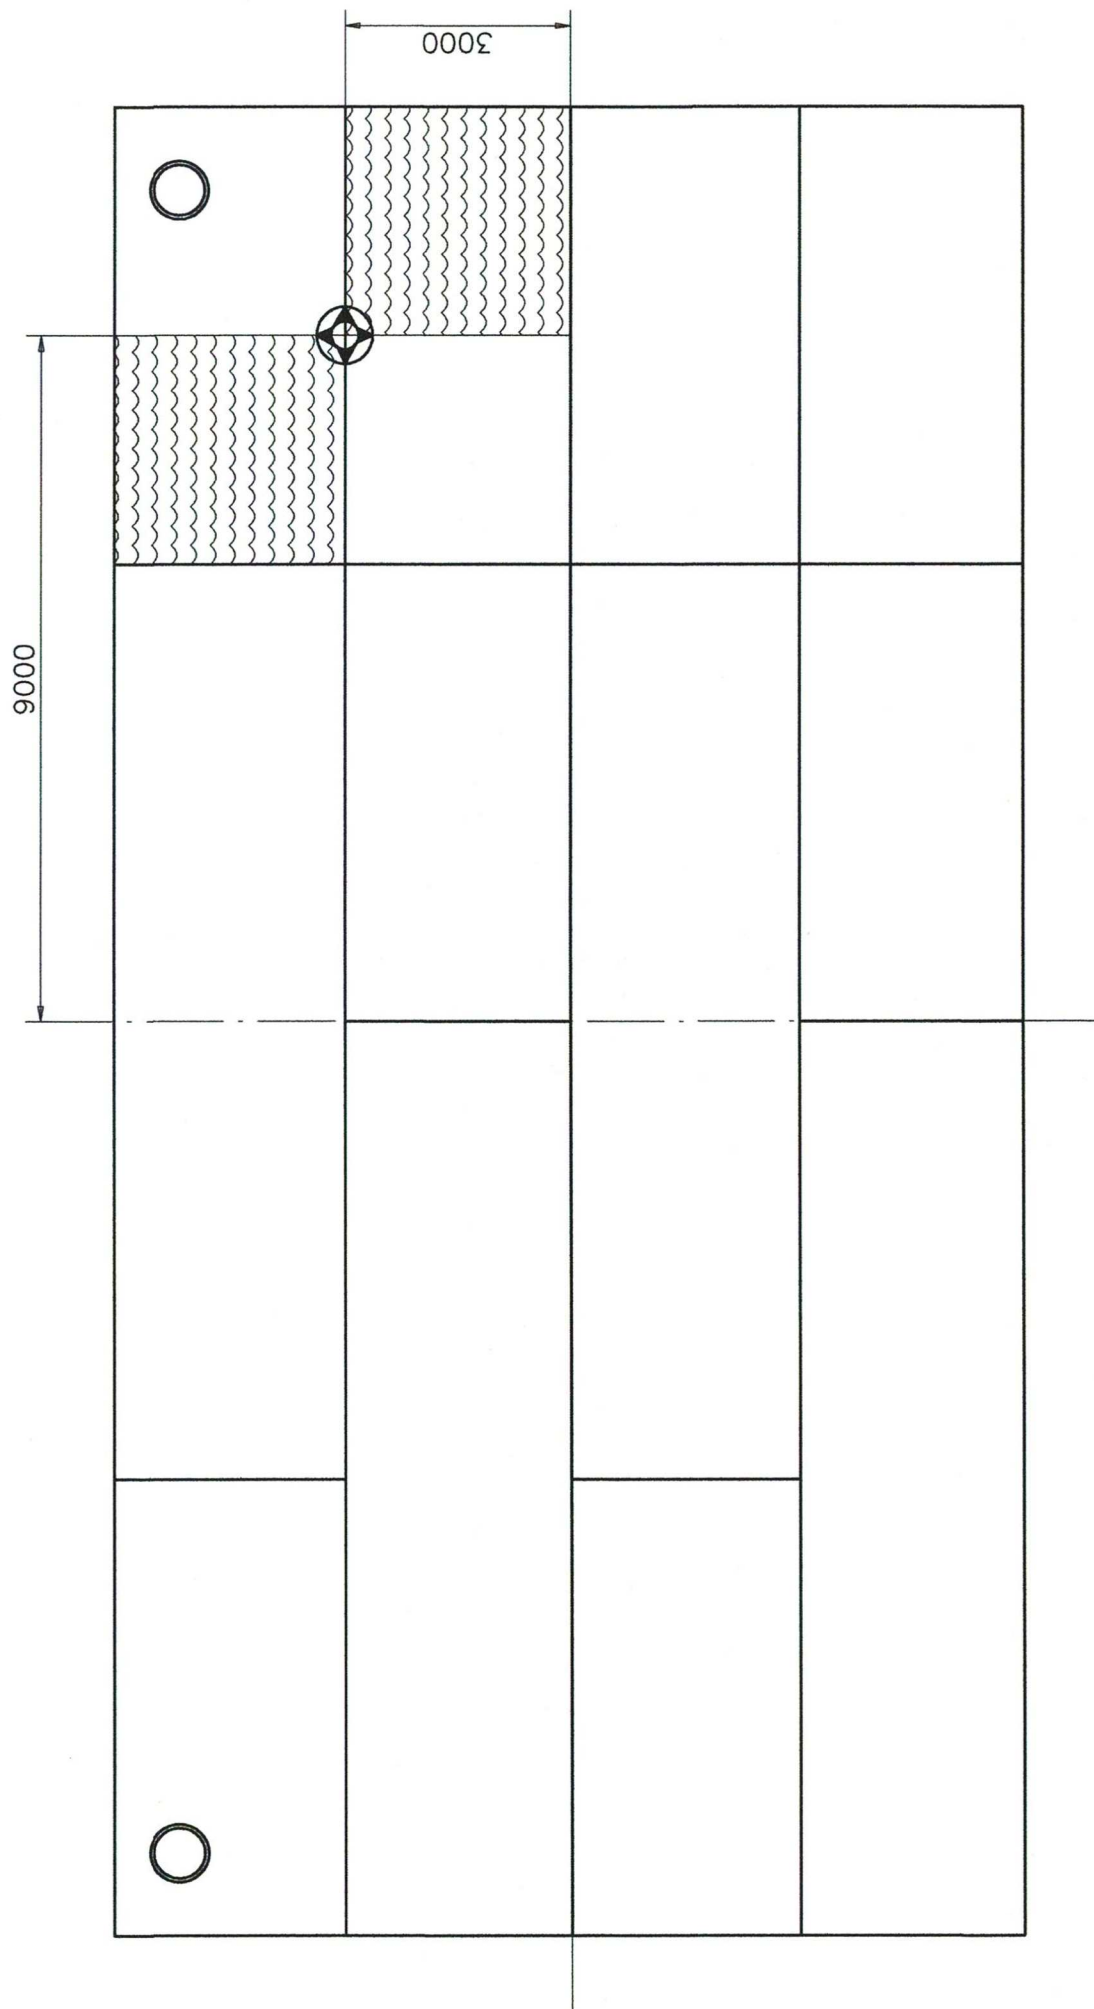


Ballastwater:
2 compartimenten = 27 ton

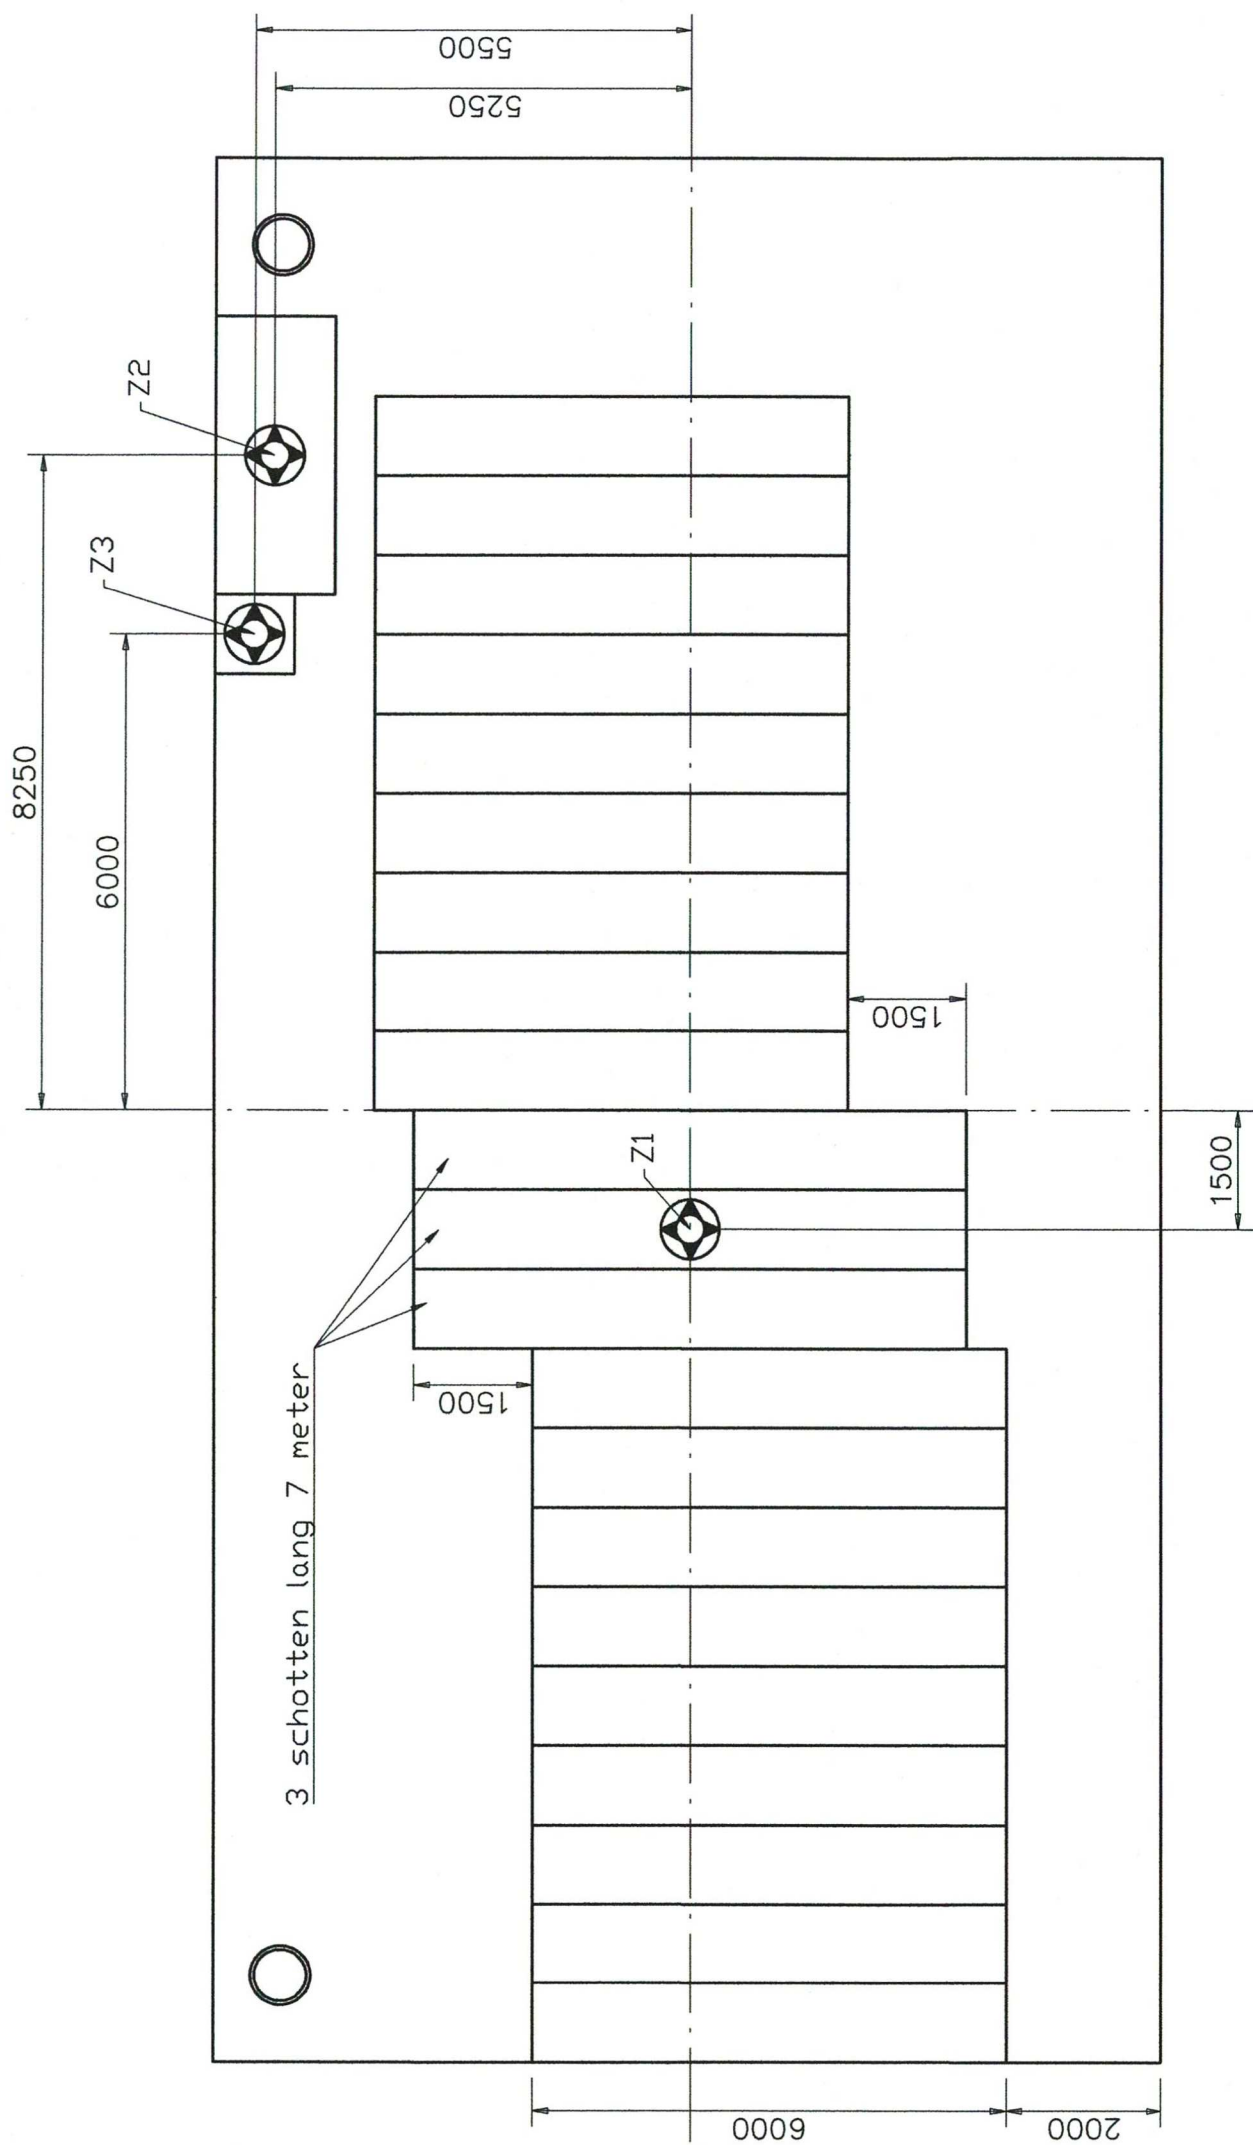


- 1: draglineschotten (18 stuks lang 6,00 en 3 stuks lang 7,00)
- 2: aggregaat (3 ton)
- 3: gasoliebak (3 ton)

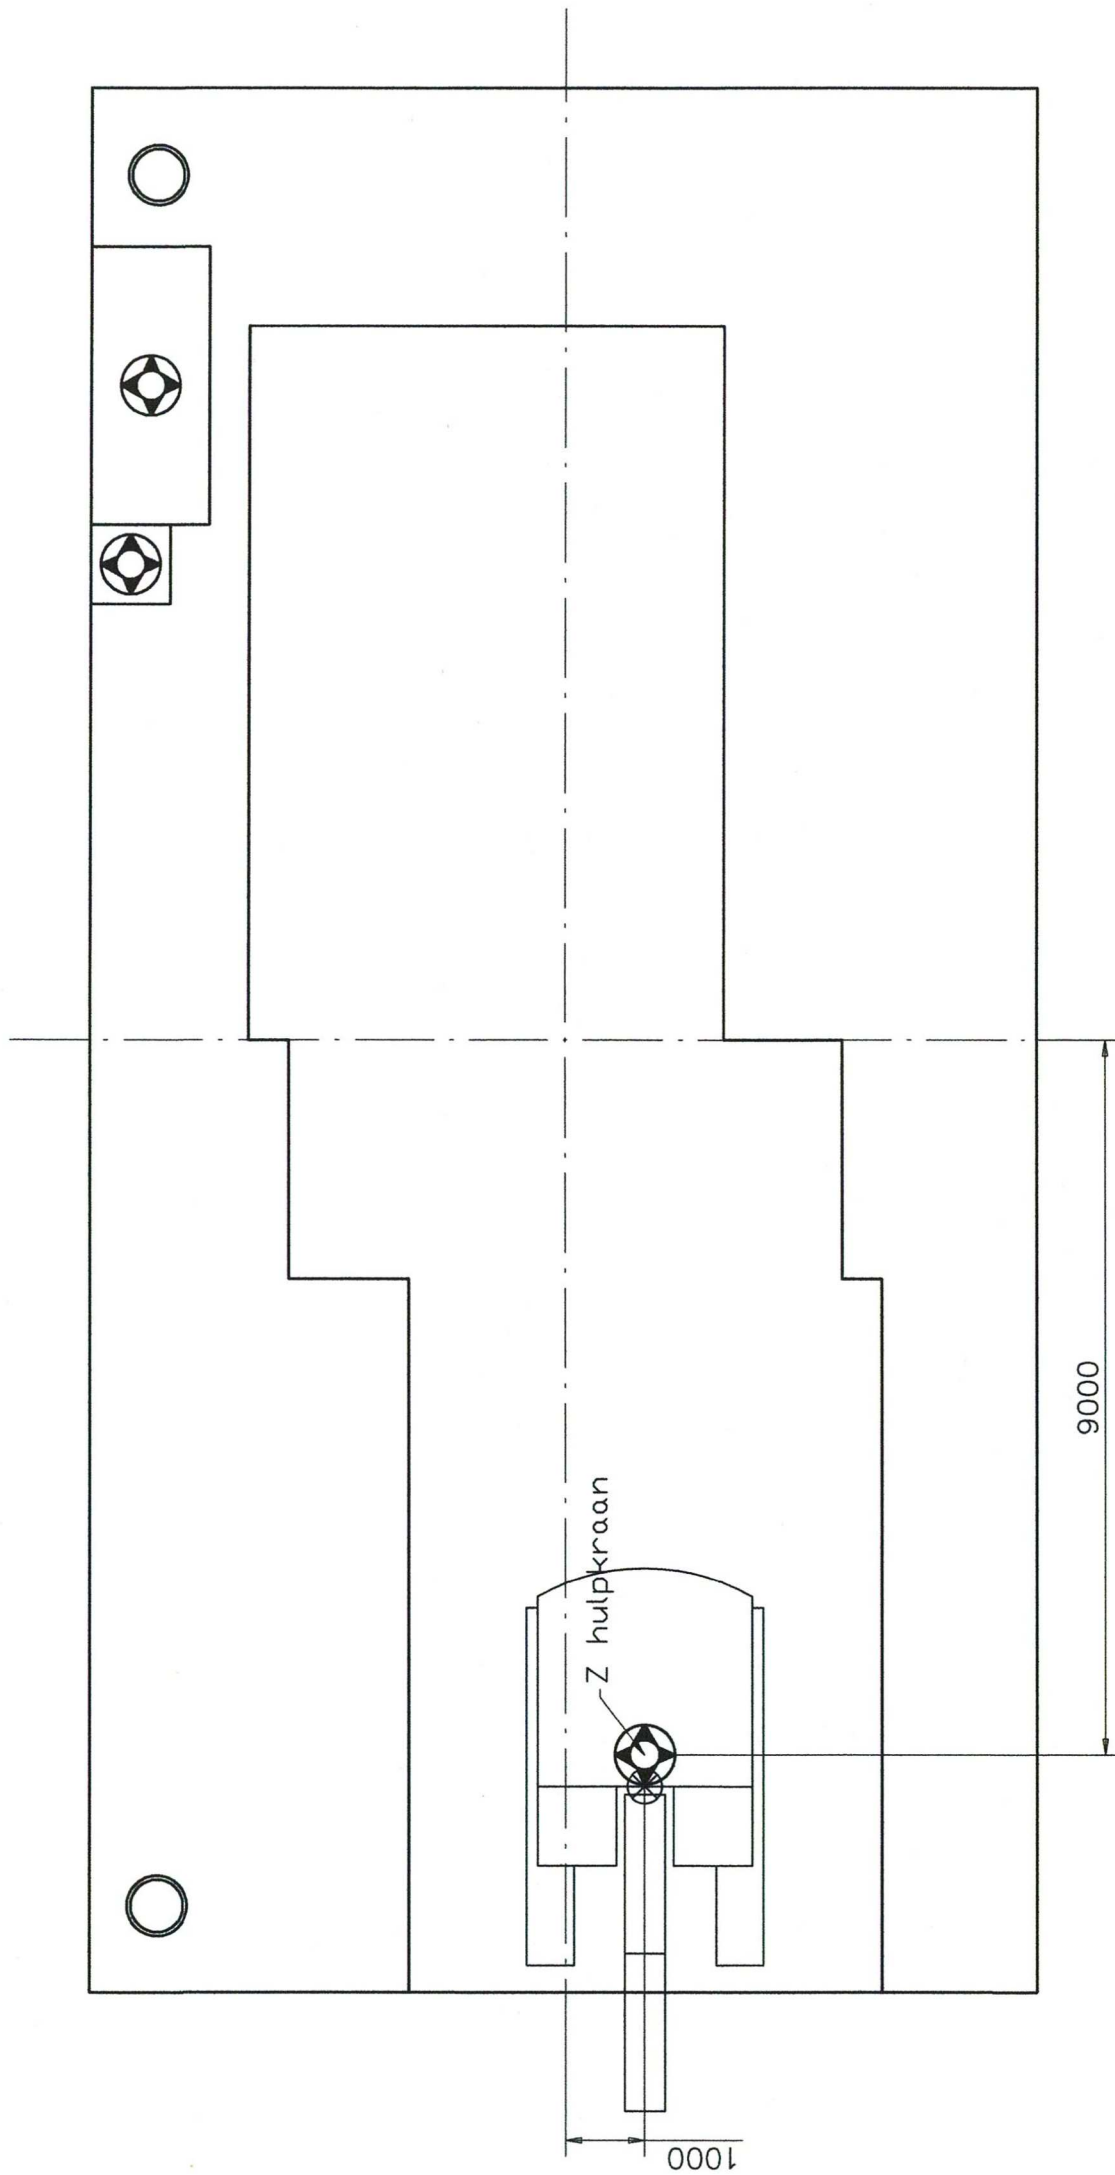

hulpkraan (18 ton) aan boord rijden

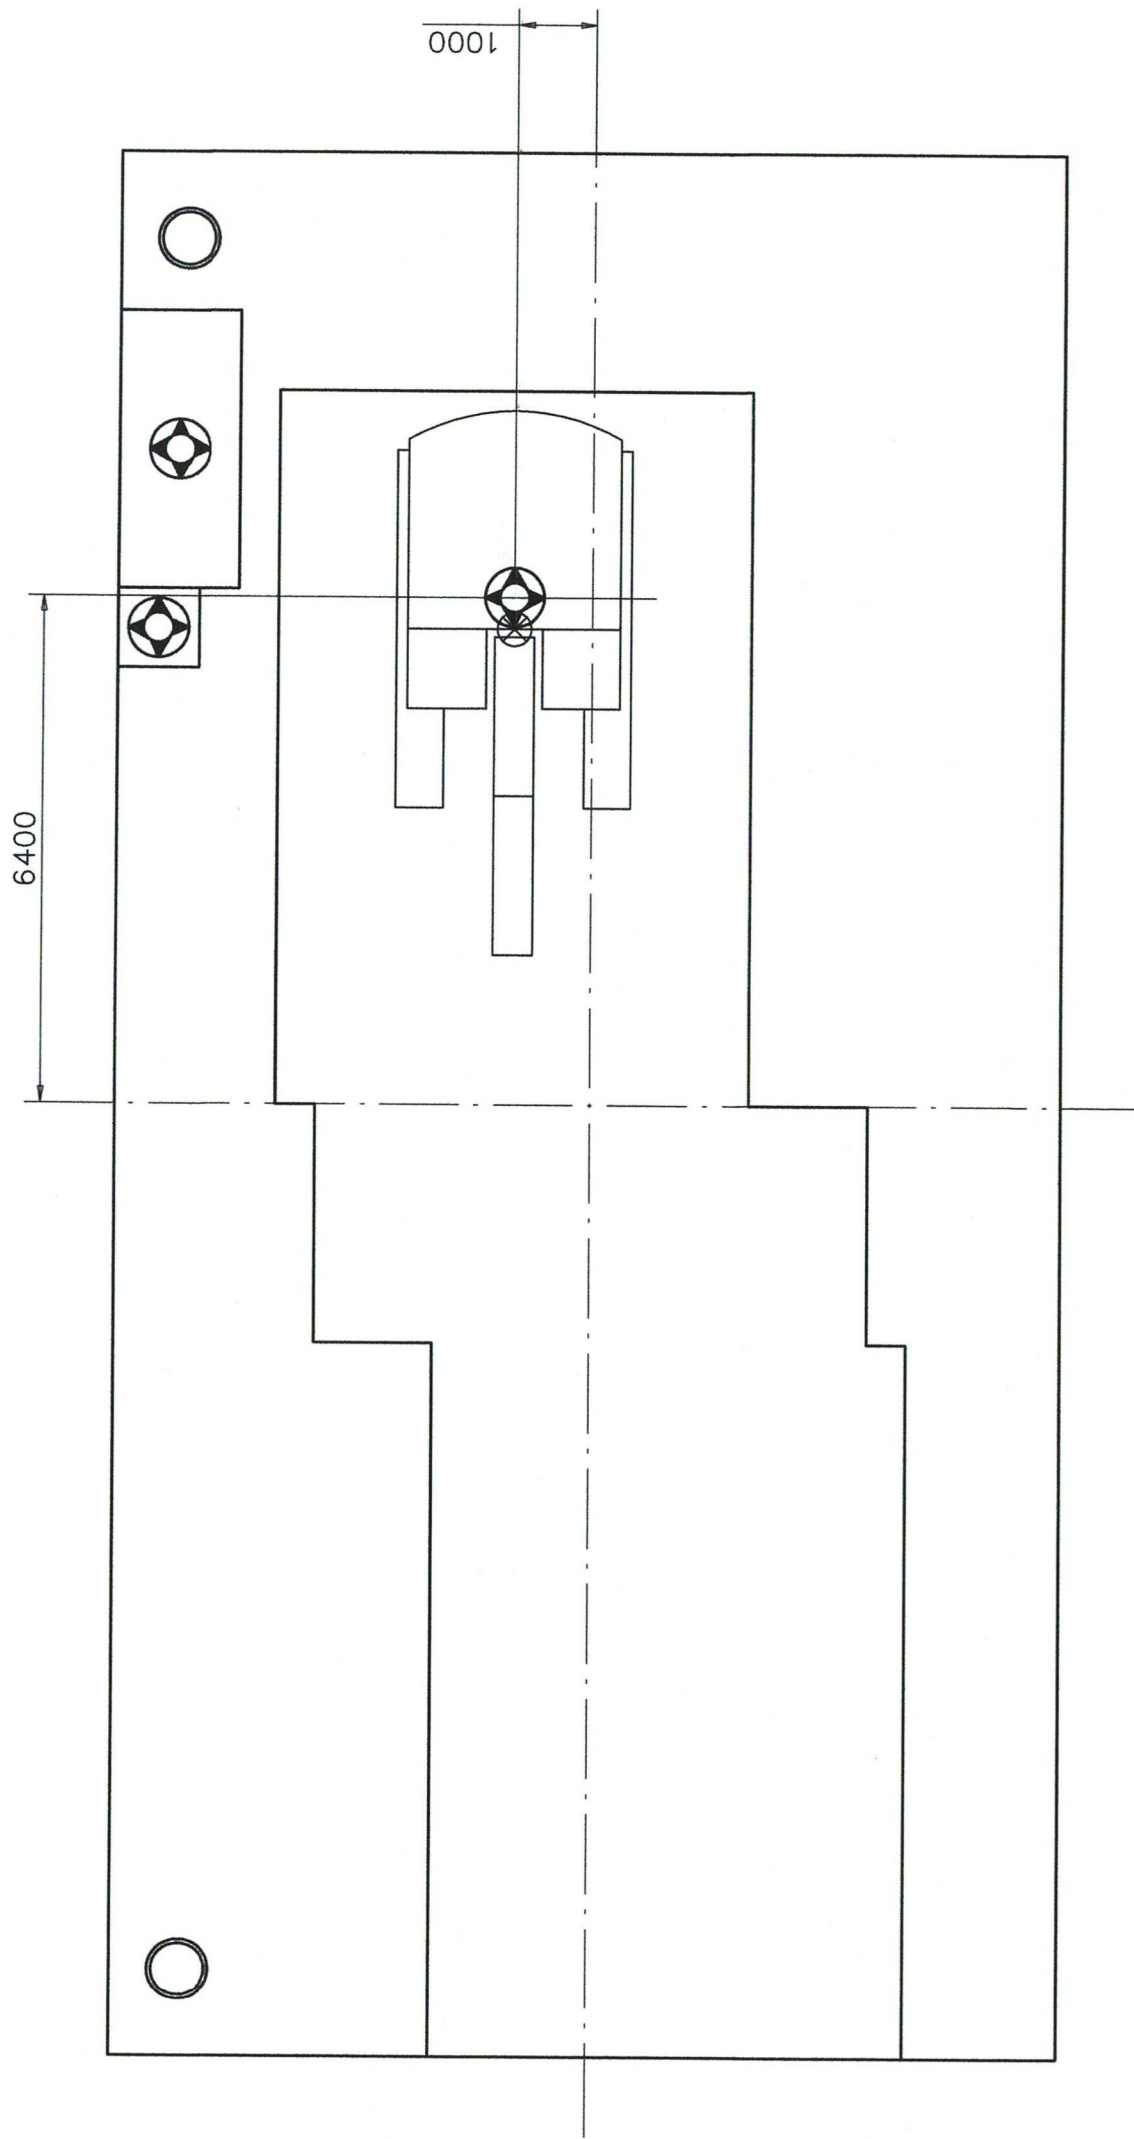

Hulpkraan naar voren rijden

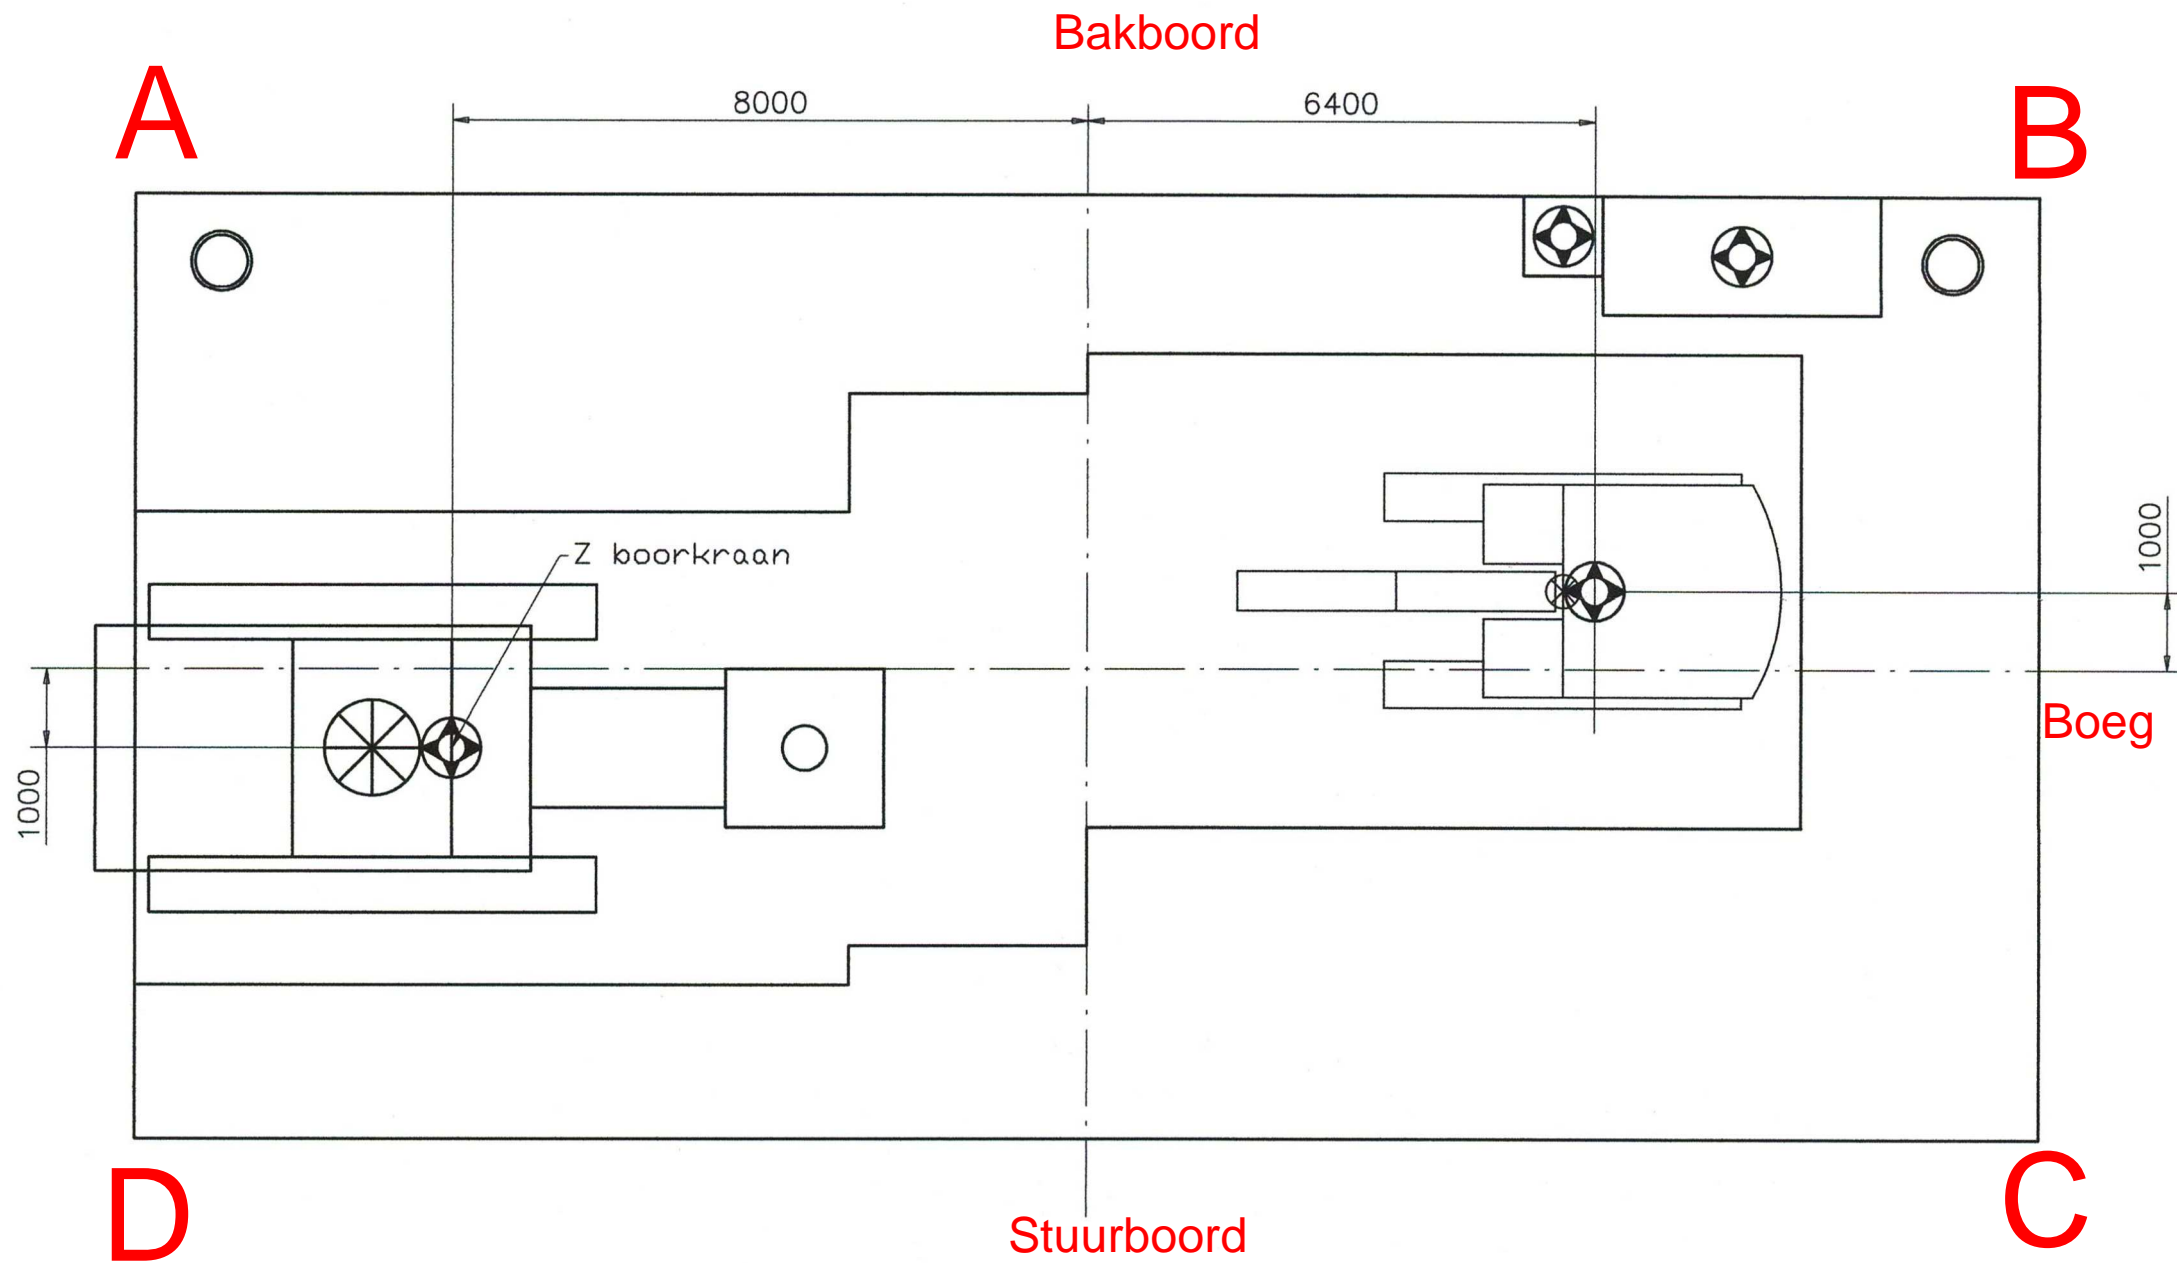

Boorkraan (80 ton) aan boord rijden
